Projektplan Mandanten-Onboarding software:112

Generische Vorlage je Betrieb · Aufwandsbewertung nach Paket Basis / Standard / Premium · IC&P Consultants e.U. · Stand 23. September 2026

Ein Betrieb ist in 3 bis 8 Wochen produktiv – je nach Paket rund 19 bis 39 Stunden Aufwand bei IC&P, den größeren Teil trägt der Betrieb selbst mit seinen Stammdaten. Dieser Plan ist die generische Vorlage je Mandant; der Onboarding-Guide in der App (Administration → Onboarding) bleibt die technische Klick-Checkliste dazu und wird hier nicht wiederholt.

Zweck und Pakete


Der Plan macht aus dem Guide ein Projekt: Phasen, Verantwortliche, Voraussetzungen, Aufwand. Er gilt für alle drei Pakete; paketabhängige Schritte sind markiert. Weingarten, Kellerbuch und CRM (inkl. Aufgabenzuordnung und Benachrichtigungen seit 22.9.2026) sind in jedem Paket enthalten und werden immer eingerichtet.

Paket	Preis/Monat	Zusätzlich zu Weingarten, Kellerbuch, CRM, Morgenbericht	Benutzer	Frag dein Weingut
Basis	199 €	–	1	50 Abfragen/Monat
Standard	299 €	Newsletter, E&A-Rechnung mit BMD-Übergabe, Controlling, Wetter & Empfehlungen je Ried	5	100 Abfragen/Monat
Premium	399 €	wie Standard + bot:112 mit Sprachsteuerung, Exportaufträge	unbegrenzt	unbegrenzt

Rollen im Projekt: **IC&P** (Projektleitung, technische Anlage, Schulung), **Betriebs-Manager** (tenant_admin des Betriebs, Ansprechpartner, Stammdaten), **Mitarbeiter** (werden geschult, verbinden ihr Postfach). Steuerberater und Bank kommen nur im Paket Standard/Premium dazu.

Phasenüberblick

Sechs Phasen, wobei Phase 2 (Stammdaten) und Phase 3 (Module) parallel laufen. Der Betrieb bestimmt das Tempo: die Kalenderzeit hängt fast nur davon ab, wie schnell Rieden, Behälter und Kontakte geliefert werden.

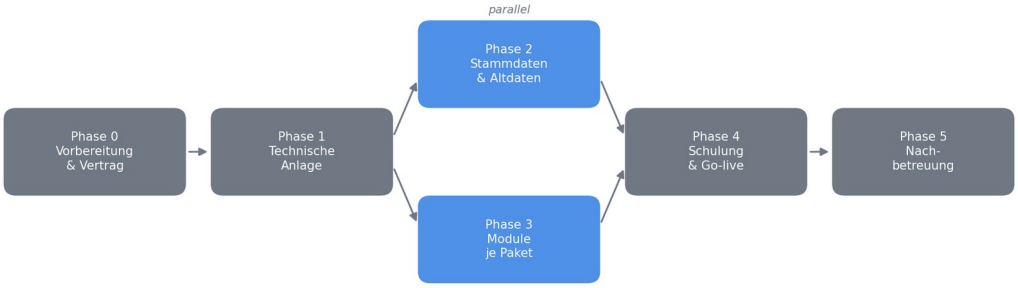

Phase 1 dauert einen Tag; danach arbeiten Betrieb (Stammdaten) und IC&P (Module) nebeneinander bis zum Go-live.

Phase	Inhalt	Verantwortlich	Basis	Standard	Premium
0	Erstgespräch, Paketwahl, Vertrag, Datenschutz, Ansprechpartner	IC&P + Betriebs-Manager	Woche 1	Woche 1	Woche 1
1	Mandant, Abo, Benutzer, Rollen, Betriebsdaten, Branding	IC&P	Woche 1	Woche 1	Woche 1
2	Rieden, Behälter, Betriebsmittel, Kontakte, Flaschenlager	Betrieb (IC&P importiert)	Woche 1–3	Woche 1–4	Woche 1–5
3	Verkauf/Rechnung, E-Mail, ggf. E&A, Newsletter, Controlling, bot:112, Export	IC&P	Woche 2	Woche 2–4	Woche 2–6

Phase	Inhalt	Verantwortlich	Basis	Standard	Premium
4	Schulung, 2 Wochen Probebetrieb, Abnahme, Go-live	IC&P + alle Benutzer	Woche 3–4	Woche 4–6	Woche 5–8
5	30 Tage Nachbetreuung, Feinjustierung, Übergabe in den Support	IC&P	Woche 5–8	Woche 7–10	Woche 9–12

Phase 0 – Vorbereitung und Vertrag

Ziel: Paket, Vertrag und Ansprechpartner stehen, bevor irgendetwas angelegt wird. Dauer 1 Woche, Aufwand IC&P 2–3 h, Betrieb 1–2 h.

Schritt	Wer	Ergebnis
Erstgespräch (60 min): Betriebsgröße, Rieden, Gebinde, Verkaufskanäle, Buchhaltungsart (E&A selbst oder Doppik beim Steuerberater), vorhandene Systeme	IC&P + Betriebs-Manager	Paketempfehlung, Liste der Altdaten
Paketwahl und Nutzungsvertrag V2 mit Anlagen 1–3 (Leistungsbeschreibung, AGB, AVV)	Betrieb unterschreibt	unterschriebener Vertrag
Ansprechpartner benennen: Betriebs-Manager (tenant_admin), Vertretung, ggf. Steuerberater	Betrieb	Kontaktliste
Altdaten-Inventur: Rieden (Flurstücke, AMA-Meldung), Behälterliste, Kontakte (Excel/Altsystem), offener Flaschenbestand, Preisliste, Rabattgruppen	Betrieb liefert, IC&P prüft Format	Dateien in vereinbarter Ablage
Termin für Schulung und gewünschter Go-live-Tag (idealerweise Monatsanfang, nicht in der Lese)	beide	Termine im Kalender

Bei Standard/Premium zusätzlich: Kontenplan bzw. BMD-Vorgaben vom Steuerberater, Newsletter-Absenderadresse (Domain-Freigabe für Brevo), SumUp-Konto falls Kartenzahlung gewünscht.

Phase 1 – Technische Anlage

Ziel: Der Betrieb existiert als Mandant, der Betriebs-Manager kann sich anmelden und sieht sein Branding. Dauer 1 Tag, Aufwand IC&P 2–3 h.

1. Mandant anlegen – über die Selbstregistrierung (/signup mit Stripe-Abo, Paket setzt die Module automatisch) oder durch IC&P unter Administration → Mandanten → Neu; Slug und Kundennummernkreis festlegen.
2. Betriebs-Manager einladen und als tenant_admin setzen; weitere Benutzer je Paketlimit (Basis 1, Standard 5, Premium unbegrenzt) mit Rolle Mitarbeiter oder Leser und Schreibmodulen.
3. Betriebsdaten: Name, Adresse, UID, Bankverbindung (IBAN/BIC, Zahlungsziel), USt-Satz (13 % Produzent, 20 % Händler), Rechnungs- und Kundennummern-Präfix.
4. Branding: Logo, Primär- und Sekundärfarbe – erscheint in Sidebar und auf allen Druckdokumenten.
5. Regeln unter Mein Betrieb: Gärkontroll-Intervall, Fristen-Vorwarnung, Betriebsbeginn, Morgenbericht ein.
6. Kontrolle: Mitgliedschaft aktiv, Paketmodule stimmen, Smoke-Test unter Administration → Systembericht für den neuen Mandanten grün.

Ergebnis-Check: Betriebs-Manager meldet sich an, sieht die Übersicht mit Logo und leeren Kacheln, bekommt die Willkommens-E-Mail.

Phase 2 – Stammdaten und Altdaten

Ziel: Alles, was der Betrieb täglich braucht, ist drin – Rieden, Gebinde, Betriebsmittel, Kontakte, Flaschenlager. Das ist die Phase mit dem größten Aufwand beim Betrieb (8–20 h) und der häufigste Grund für Verzögerung. IC&P importiert, was als Datei kommt (2–6 h), der Betrieb erfasst den Rest selbst.

Stammdaten	Weg	Wer	Richtwert
Rieden und Flurstücke (Fläche, Rebsorte, Pflanzjahr, Erziehung)	CSV-Import Grundstücke + Rieden-Details, sonst manuell	Betrieb liefert, IC&P importiert	15 Rieden: 1 h Import, 3 h manuell
Behälter (Tanks, Fässer: Typ, Volumen, Standort)	CSV-Import Gebinde oder Kellerbuch → Neuer Behälter	Betrieb	40 Gebinde: 1–2 h
Pflanzenschutz- und Düngemittel-Stammdaten (Wartezeit, Cu-Gehalt, Bio-Zulassung)	Rieden → Betriebsmittel → Stammdaten	Betrieb	20 Mittel: 2 h
Kontakte und Firmen mit E-Mail (Pflicht für E-Mail-Zuordnung und Dubletten-Prüfung)	CSV-Import Kontakte/Firmen, danach Dubletten-Sicht	Betrieb liefert, IC&P importiert und bereinigt	500 Kontakte: 2–3 h inkl. Bereinigung
Rabattgruppen und Preise (Gastronomie, Stammkunde, Ab-Hof)	Warenwirtschaft → Rabattgruppen	Betrieb	1 h
Flaschenlager (Bestand je Wein, Jahrgang, Gebinde) zum Stichtag	CSV-Import Füllungen	Betrieb zählt, IC&P importiert	1–2 h
Aktueller Jahrgang im Kellerbuch (Chargen, Füllstände, Weinart)	manuell oder ab nächster Lese über Erntemeldung	Betrieb	2–4 h oder 0 h bei Start vor der Lese

Abnahmekriterium: Kellerbestand in Litern und Flaschenlager in der Übersicht stimmen mit der Realität am Stichtag überein; kein Kontakt ohne E-Mail, dessen Adresse bekannt ist.

Empfehlung: Start des Kellerbuchs mit der nächsten Lese statt Rückerfassung des laufenden Jahrgangs – spart dem Betrieb 2–4 h und vermeidet Bruch in der Rückverfolgung.

Phase 3 – Module je Paket einrichten

Ziel: Jedes gebuchte Modul ist konfiguriert und einmal durchgespielt. Basis 3–4 h, Standard 8–12 h, Premium 12–18 h bei IC&P; der Betrieb liefert Zugangsdaten und Vorgaben (2–6 h).

Alle Pakete

Modul	Einrichtung	Voraussetzung vom Betrieb	IC&P
Verkauf und Rechnung	Testverkauf mit Rechnungsdruck, Offene Posten, Zahlungseingang buchen	Bankdaten, Zahlungsziel, Rechnungsvorlage-Wünsche	1 h
CRM und Kalender	Aktivitätsarten, Pipeline-Stufen, Aufgabenzuordnung (Verantwortlich/für alle), Benachrichtigungen per Glocke und E-Mail	Benutzer angelegt	0,5 h
E-Mail-Anbindung	M365 je Benutzer (Nachrichten → Mit Microsoft verbinden) oder SMTP je Betrieb; Shared Mailbox optional; Test-Mail an Kontakt	M365-Tenant mit Admin-Freigabe der App-Berechtigungen (Mail, Kalender) oder SMTP-Zugang	1–2 h
Meldungen und Fristen	Fristenkalender prüfen (AMA, Erntemeldung, Prüfnummer), Vorwarnung setzen	Betriebsnummer, Meldepflichten	0,5 h

Modul	Einrichtung	Voraussetzung vom Betrieb	IC&P
Morgenbericht und Frag dein Weingut	Morgenbericht aktivieren, Wetter/Rieden nur ab Standard; KI-Limit je Paket automatisch	–	0,5 h

Standard und Premium zusätzlich

Modul	Einrichtung	Voraussetzung vom Betrieb	IC&P
E&A-Rechnung	Buchhaltungsart (E&A oder Doppik beim Steuerberater), Kategorien, Konten, Betriebsbeginn, UVA-Zeitraum, Daueraufträge, Anlagen & AfA; Eröffnungssalden zum Stichtag	Kontenplan/Kategorien, Bankkonten, Anlagenverzeichnis, Vorgaben des Steuerberaters	3–5 h
BMD-Übergabe	Personenkonten-Nummernkreise, Export-Test mit Steuerberater	BMD-Mandantennummer, Kontenrahmen	1–2 h
Belege (OCR) und SVS	Beleg-Upload testen, SVS-Beitragslogik prüfen	Beispielbelege, SVS-Vorschreibung	1 h
Newsletter	Brevo-Absender und Listen, Domain-Authentifizierung (SPF/DKIM), Empfängergruppen aus CRM, Test-Aussendung, Abmeldelink	Absenderadresse, DNS-Zugang	1–2 h
Controlling und Kostenrechnung	Kostenstellen, Kostenarten, Zeiterfassung ein; erste Auswertung	Kostenstellen-Struktur	1–2 h
Wetter und Empfehlungen je Ried	Koordinaten der Rieden prüfen, Abwasch-Schwelle, Intervall	–	0,5 h

Premium zusätzlich

Modul	Einrichtung	Voraussetzung vom Betrieb	IC&P
bot:112 mit Sprachsteuerung	Assistent aktivieren, Aktionen freigeben, Korrekturen einspielen, 30-min Einführung	Mikrofon-Freigabe im Browser, Testfragen aus dem Alltag	1–2 h
Exportaufträge	Importeure als Firmen, Incoterms, Transportbescheinigung/DAC testen	Importeurliste, Zolldaten	1–2 h

Optional in jedem Paket: SumUp-Kartenzahlung (Terminal koppeln, Checkout testen, 1 h), Kellergemeinschaft (nur wenn Betriebe gemeinsam kellern, 1–2 h). Registrierkasse/RKSV ist ausdrücklich nicht Teil des Onboardings, bis Anlage 4 vorliegt.

Microsoft 365: Anpassungen in Entra ID

Jeder Betrieb mit Microsoft 365 braucht eine eigene App-Registrierung in seinem Entra ID (vormals Azure AD); sie macht der Entra-Administrator des Betriebs, nicht IC&P. Aufwand für den Admin 30–45 Minuten, sofern er die Schritte unten vor sich hat; ein externer IT-Dienstleister kostet erfahrungsgemäß 1–3 Stunden Abstimmung. Ohne diese Registrierung bleibt nur SMTP als E-Mail-Anbindung, ohne Kalender.

Grundregel für jede spätere Änderung: Berechtigung in Entra ergänzen → „Administratorzustimmung erteilen“ → alle Benutzer unter Nachrichten › Einstellungen einmal „Trennen & neu verbinden“. Erst die neue Verbindung erhält die neue Berechtigung.

Übersicht der Berechtigungen

Alle Berechtigungen sind vom Typ „Delegiert“ (Microsoft Graph); software:112 handelt immer im Namen des angemeldeten Benutzers und nie mit Anwendungsrechten auf alle Postfächer.

Berechtigung	Wofür in software:112	Ausbaustufe	Admin-Zustimmung
offline_access	Verbindung bleibt ohne tägliche Neuanmeldung bestehen (Refresh-Token)	Grundausstattung	ja
User.Read	Name und Adresse des Benutzers beim Verbinden auslesen (bei neuer Registrierung vorausgewählt)	Grundausstattung	ja
Mail.ReadWrite	Eigenes Postfach lesen, Ordner, Löschen, Entwürfe; E-Mail-Zuordnung zu Kontakten	Grundausstattung	ja
Mail.Send	Aus dem CRM und aus Nachrichten senden	Grundausstattung	ja
Calendars.Read	Eigenen Outlook-Kalender im CRM-Kalender spiegeln; Frei/Belegt der Kollegen im Termin-Dialog	Grundausstattung	ja
Mail.ReadWrite.Shared	Geteiltes Postfach (z. B. office@…) lesen und verwalten	Shared Mailbox	ja
Mail.Send.Shared	Aus dem geteilten Postfach senden	Shared Mailbox	ja
Calendars.ReadWrite	Termin aus dem CRM im eigenen Outlook anlegen und Kollegen einladen	Kalender-Einladungen	ja

Hauptänderungen (Grundausstattung, einmal je Betrieb)

1. entra.microsoft.com → Identität → Anwendungen → App-Registrierungen → **Neue Registrierung**; Name „software:112“.
2. Unterstützte Kontotypen: **„Konten in einem beliebigen Organisationsverzeichnis (mehrinstanzenfähig)“**. Die persönliche Postfach-Verbindung meldet sich über den gemeinsamen Microsoft-Endpunkt an; eine Einzelmandanten-App wird dort mit AADSTS50194 abgewiesen.
3. Authentifizierung → Plattform hinzufügen → **Web** → beide Umleitungs-URIs eintragen: https://software112.icp-consultants.at/api/auth/m365/callback (Betriebs-Verbindung) und https://software112.icp-consultants.at/api/auth/m365/user/callback (Verbindung je Benutzer).
4. Zertifikate & Geheimnisse → **Neuer geheimer Clientschlüssel**, Gültigkeit 24 Monate. Den Wert sofort kopieren (er ist später nicht mehr sichtbar) und das Ablaufdatum in den IC&P-Kalender eintragen – ein abgelaufenes Geheimnis trennt alle Benutzer gleichzeitig.
5. API-Berechtigungen → Berechtigung hinzufügen → Microsoft Graph → **Delegierte Berechtigungen**: offline_access, User.Read, Mail.ReadWrite, Mail.Send, Calendars.Read → danach **„Administratorzustimmung für <Organisation> erteilen“** (Status muss für jede Zeile grün sein).
6. Übersicht der App: **Verzeichnis-ID (Tenant-ID)** und **Anwendungs-ID (Client-ID)** notieren und zusammen mit dem geheimen Clientschlüssel an IC&P übergeben (verschlüsselt oder telefonisch, nicht im Klartext per E-Mail).
7. IC&P trägt die drei Werte unter Administration → Mandanten → Betrieb → M365 ein und verbindet die Betriebs-Mailbox; der Echtzeit-Webhook für neue E-Mails braucht keine zusätzliche Entra-Einstellung.
8. Jeder Benutzer: Nachrichten → „Mit Microsoft verbinden“, mit dem eigenen Microsoft-Konto anmelden. Test: eine E-Mail an einen Kontakt senden, sie erscheint als Aktivität beim Kontakt.

Zusatz für geteilte Postfächer (Shared Mailbox)

Nötig, wenn der Betrieb eine gemeinsame Adresse wie office@ oder info@ in software:112 bearbeiten will. Ein Teil passiert in Entra, der andere im Exchange Admin Center.

1. Entra → App-Registrierung → API-Berechtigungen: **Mail.ReadWrite.Shared** und **Mail.Send.Shared** (delegiert) ergänzen → Administratorzustimmung erteilen. Ohne die .Shared-Berechtigungen antwortet Graph mit 403 ErrorAccessDenied, obwohl der Benutzer in Outlook vollen Zugriff hat.
2. admin.exchange.microsoft.com → Empfänger → Postfächer → geteiltes Postfach → Delegierung: jedem berechtigten Benutzer **„Lesen und verwalten“ (Vollzugriff)** geben – **direkt als Person**, nicht über eine Gruppe; Graph erkennt über Gruppen vergebenen Vollzugriff oft nicht.

3. Im selben Dialog **„Senden als“** vergeben, damit Antworten mit der gemeinsamen Adresse als Absender rausgehen.
4. Exchange übernimmt die Rechte mit Verzögerung (bis zu 60 Minuten). Danach trennt jeder betroffene Benutzer unter Nachrichten › Einstellungen einmal und verbindet neu.
5. In software:112: Nachrichten › Einstellungen → primäre Adresse des geteilten Postfachs eintragen und speichern. Eigenes und geteiltes Postfach erscheinen dann nebeneinander.

Zusatz für den Kalender

Der Kalender kommt in zwei Stufen. Stufe 1 funktioniert mit der Grundausstattung, Stufe 2 braucht eine zusätzliche Berechtigung und einen Schalter in software:112 – die Reihenfolge ist wichtig.

Stufe 1 – Spiegeln und Frei/Belegt (Calendars.Read, Grundausstattung): Der eigene Outlook-Kalender erscheint im CRM-Kalender; im Termin-Dialog sieht man, wann Kollegen belegt sind. Was bei Kollegen sichtbar ist, bestimmt deren Outlook-Freigabe: Standard in Microsoft 365 ist „Nur Frei/Gebucht“ für die Organisation, Betreff und Ort erscheinen nur, wenn der Kollege seinen Kalender freigegeben hat. In der Auswahl stehen nur Kollegen, die ihr Outlook in software:112 verbunden haben.

Stufe 2 – Termine anlegen und einladen (Calendars.ReadWrite):

1. Entra → App-Registrierung → API-Berechtigungen → **Calendars.ReadWrite** (delegiert) ergänzen → Administratorzustimmung erteilen.
2. IC&P setzt danach unter Administration → Mandanten → Betrieb → M365 den Schalter **„Termine in Outlook anlegen“**. Nicht vorher: Mit gesetztem Schalter fordert die Anmeldung das Schreibrecht an, und ohne Freigabe in Entra würde die Anmeldung aller Benutzer scheitern.
3. Alle Benutzer trennen unter Nachrichten › Einstellungen einmal und verbinden neu. Bis dahin bleibt „In Outlook anlegen“ im Termin-Dialog ausgegraut; alles andere läuft unverändert weiter.
4. Test: Termin im CRM-Kalender mit „In Outlook anlegen“ und einem eingeladenen Kollegen speichern – der Termin steht im eigenen Outlook, der Kollege erhält eine normale Outlook-Einladung.

software:112 schreibt dabei nur in den Kalender des angemeldeten Benutzers; Kollegen bekommen eine Einladung, die sie annehmen oder ablehnen. Ein Schreibzugriff auf fremde Kalender ist weder nötig noch vorgesehen.

Häufige Fehlermeldungen

Meldung	Ursache	Abhilfe
AADSTS50194	App ist als Einzelmandanten-App registriert	Unterstützte Kontotypen auf „mehrinstanzenfähig“ umstellen
AADSTS50011	Umleitungs-URI fehlt oder weicht ab	Beide URIs exakt wie oben unter Plattform „Web“ eintragen
AADSTS65001 oder „Genehmigung erforderlich“	Administratorzustimmung fehlt für eine Berechtigung	In Entra „Administratorzustimmung erteilen“, dann neu verbinden
AADSTS7000215 / Token-Refresh fehlgeschlagen	Geheimer Clientschlüssel abgelaufen oder falsch kopiert	Neues Geheimnis anlegen, in software:112 eintragen
403 ErrorAccessDenied beim geteilten Postfach	.Shared-Berechtigungen fehlen oder Vollzugriff nur über Gruppe	Schritte 1–2 bei „Geteilte Postfächer“ prüfen, neu verbinden
„In Outlook anlegen“ ausgegraut	Schalter nicht gesetzt oder Verbindung noch ohne Schreibrecht	Kalender Stufe 2, Schritte 2–3

Sicherheit und Barrierefreiheit je Betrieb

Pro Betrieb kommen rund 1–1,5 Stunden bei IC&P dazu, verteilt auf Phase 0, 1 und 4; die Aufwandsbewertung weiter unten deckt das innerhalb ihrer Spannen ab. Die Befunde und Maßnahmen für die Software selbst stehen in der eigenen Bestandsaufnahme „Cyber-Security und Barrierefreiheit software:112“.

Im Erstgespräch (Phase 0)

- **NIS-2-Frage stellen:** Hat der Betrieb 50 oder mehr Beschäftigte oder über 10 Mio. € Umsatz und Bilanzsumme? Dann ist er ab 1.10.2026 voraussichtlich „wichtige Einrichtung“ nach NISG 2026 und muss seine Lieferkette absichern. In diesem Fall das Sicherheitsblatt (technische und organisatorische Maßnahmen, Unterauftragnehmer, Meldeweg) mit dem Vertrag übergeben und einen Ansprechpartner für Sicherheitsvorfälle auf beiden Seiten festlegen.
- **Bedarf an Barrierefreiheit erfragen:** Arbeitet jemand mit Vorleseprogramm, starker Vergrößerung oder Farbfehlsichtigkeit? Dann Schulung und Einstellungen darauf abstimmen und bekannte Einschränkungen offen ansprechen.
- **Verbraucher-Angebote klären:** Verschickt der Betrieb Newsletter oder betreibt einen Webshop und ist kein Kleinstunternehmen (unter 10 Beschäftigte und höchstens 2 Mio. €)? Dann gilt für diese Angebote das Barrierefreiheitsgesetz – Newsletter aus software:112 mit Alternativtexten für Bilder anlegen.

Bei der Anlage (Phase 1)

Einstellung	Empfehlung	Warum
Rollen	Nur ein bis zwei Betriebs-Manager; alle anderen Mitarbeiter mit Schreibrecht nur für ihre Module, Aushilfen als Leser	Weniger Konten mit Vollzugriff
Persönliche Konten	Jede Person mit eigenem Login, keine gemeinsamen Zugänge („buero@…“)	Nachvollziehbarkeit, sauberes Offboarding
Automatische Abmeldung	30 Minuten im Büro, 60–120 Minuten im Keller/Außendienst	Schutz bei unbeaufsichtigten Geräten
Zwei-Faktor-Anmeldung	Pflicht für Betriebs-Manager, sobald verfügbar (geplant Oktober 2026)	Schutz vor gestohlenen Passwörtern
Branding-Farben	Kontrast Aktionsfarbe zu Schrift mindestens 4,5 : 1 prüfen, sonst dunklere Variante wählen	Lesbarkeit der Schaltflächen
Microsoft 365	Nur delegierte Berechtigungen, Ablaufdatum des Client-Geheimnisses notieren; im Entra des Betriebs bedingten Zugriff mit Zwei-Faktor empfehlen	Siehe Kapitel Entra-Anpassungen

Zur Schulung und danach (Phase 4 und 5)

- In der Schulung 5 Minuten zu Sicherheit: eigenes Passwort, keine Weitergabe, Abmelden am geteilten Keller-Tablet, verdächtige E-Mails nicht in software:112 übernehmen.
- **Offboarding festlegen:** Wer den Betrieb verlässt, wird am letzten Arbeitstag vom Betriebs-Manager unter Benutzer deaktiviert (sperrt sofort alle Daten) und trennt vorher seine Microsoft-Verbindung.
- Beim Abschlussgespräch (Tag 30) die Benutzerliste gemeinsam durchgehen; danach einmal jährlich.

Ziel: Alle Benutzer arbeiten zwei Wochen parallel im System, danach wird das Altsystem abgelöst. Aufwand IC&P 3–6 h (Basis) bis 6–10 h (Premium), Betrieb 4–8 h Schulung plus tägliche Nutzung.

Schritt	Format	Dauer	Wer
Schulung Kern (Kellerbuch, Rieden/Maßnahmen, Verkauf, CRM/Kalender mit Aufgabenzuordnung)	Vor-Ort oder Teams, am echten Mandanten	2 h	alle Benutzer
Schulung Buchhaltung (E&A, Belege, UVA, BMD) – nur Standard/Premium	Teams, mit Steuerberater	1,5 h	Betriebs-Manager + Buchhaltung
Schulung Newsletter/Controlling – nur Standard/Premium	Teams	1 h	Betriebs-Manager

Schritt	Format	Dauer	Wer
Einführung bot:112 und Export – nur Premium	Teams	1 h	alle Benutzer
Probebetrieb: 2 Wochen echte Buchungen, jede Maßnahme und jeder Verkauf im System	selbständig, IC&P erreichbar	10 Werktage	Betrieb
Abnahme: Behandlungsprotokoll, Rechnung, Kellerbuch-Bewegungen, ggf. UVA-Entwurf gegen Altsystem prüfen	Termin 60 min	1 h	IC&P + Betriebs-Manager
Go-live: Altsystem nur noch lesend, Stichtag dokumentiert, Handbuch/FAQ-Zugang gezeigt	E-Mail + kurzer Call	0,5 h	IC&P

Abnahmekriterien: mindestens ein vollständiger Verkauf mit Rechnung und Zahlungseingang, eine Maßnahme mit Behandlungsprotokoll, eine Kellerbuch-Bewegung, eine zugewiesene Aufgabe mit Benachrichtigung; bei Standard/Premium ein UVA-Entwurf und eine Test-Aussendung.


Phase 5 – Nachbetreuung

Ziel: 30 Tage nach Go-live läuft der Betrieb ohne tägliche Rückfragen und ist in den regulären Support (Anlage 3, Abschnitt 5) übergeben. Aufwand IC&P 2–4 h.

- Woche 1 nach Go-live: fixer 30-min-Call, Fragen aus dem Alltag, Feinjustierung (Fristen-Vorwarnung, Rabattgruppen, Aktivitätsarten).
- Woche 2–4: Erreichbarkeit per E-Mail, Morgenbericht und Systembericht auf Auffälligkeiten beobachten (Fehler, ungenutzte Module).
- Tag 30: Abschlussgespräch mit Kennzahlen (Benutzer aktiv, Verkäufe, Maßnahmen, offene Wünsche), Übergabe an Support, Eintrag ins Kunden-CRM von IC&P.
- Erste Lese bzw. erster Monatsabschluss nach Go-live werden begleitet, auch wenn sie außerhalb der 30 Tage liegen (je 1 h).

Aufwandsbewertung je Paket

Ein Basis-Betrieb kostet IC&P rund 19 Stunden, Standard rund 31, Premium rund 39 – bewertet mit dem Stundensatz aus Anlage 3 (150 € netto) sind das 2.900 €, 4.650 € bzw. 5.850 € interner Aufwand. Der Betrieb selbst investiert 16 bis 38 Stunden, vor allem in Phase 2.

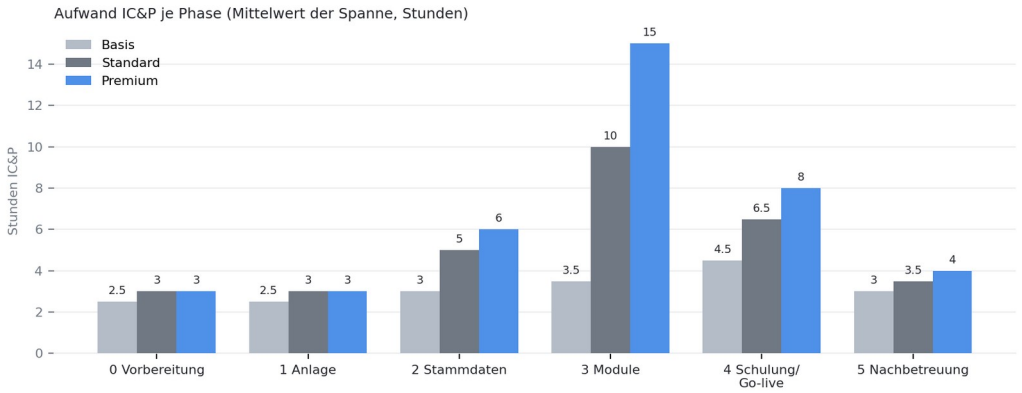

	Basis	Standard	Premium
Aufwand IC&P (Spanne)	14–24 h	26–36 h	33–44 h
Aufwand IC&P (Mittel, × 150 €)	19 h ≈ 2.900 €	31 h ≈ 4.650 €	39 h ≈ 5.850 €
Aufwand Betrieb	16–21 h	23–29 h	30–38 h

	Basis	Standard	Premium
Kalenderzeit bis Go-live	3–4 Wochen	4–6 Wochen	5–8 Wochen
Kalenderzeit inkl. Nachbetreuung	8 Wochen	10 Wochen	12 Wochen
Externe Beteiligte	keine	Steuerberater, ggf. Bank (BMD, Kontenplan)	Steuerberater, Importeure/Spedition
Monatsentgelt (zum Vergleich)	199 €	299 €	399 €

Lesart: Das Onboarding entspricht in allen drei Paketen rund 15 Monatsentgelten (14,6 / 15,5 / 14,7) – der Einrichtungsaufwand wächst im gleichen Maß wie der Preis, eine Einrichtungspauschale je Paket wäre also proportional fair. Ein Betrieb, der seine Stammdaten als saubere Dateien liefert, spart IC&P 3–6 Stunden; ein Betrieb ohne E-Mail-Adressen im Kundenstamm kostet 2–3 Stunden zusätzlich für Bereinigung.

Treiber nach oben: Doppik statt E&A (Abstimmung mit Steuerberater +2–4 h), mehr als 1.000 Kontakte (+2 h je weitere 1.000), mehr als 80 Gebinde (+1 h), Kellergemeinschaft (+2 h), M365-Freigabe durch einen externen IT-Dienstleister (+1–3 h Wartezeit-Koordination). Treiber nach unten: Start vor der Lese ohne Rückerfassung, ein einziger Benutzer, keine Altdaten-Migration.

Risiken, Abhängigkeiten, offene Entscheidungen

Die drei Risiken, die in der Praxis den Go-live verschieben, liegen alle beim Betrieb oder bei Dritten – deshalb gehören feste Liefertermine für Altdaten und M365-Freigabe in Phase 0.

Risiko / Abhängigkeit	Wirkung	Gegenmaßnahme
Altdaten kommen spät oder unvollständig (Kontakte ohne E-Mail, Behälter ohne Volumen)	Phase 2 verlängert sich um Wochen	Liefertermin und Vorlagen (CSV aus Datenexport) in Phase 0; Go-live-Termin an die Lieferung koppeln
M365-App-Berechtigungen müssen vom Entra-Admin des Betriebs freigegeben werden (Mail, Kalender; ab Kalender-Einladungen zusätzlich Calendars.ReadWrite)	E-Mail- und Kalender-Anbindung blockiert	Admin des Betriebs in Phase 0 benennen; SMTP als Übergangslösung
Steuerberater liefert Kontenplan/BMD-Vorgaben nicht rechtzeitig (Standard/Premium)	E&A-Modul nicht abnahmefähig, UVA-Test entfällt	Go-live für Kern-Module unabhängig davon; Buchhaltung als zweite Welle mit eigenem Termin
Start mitten in der Lese	Keine Zeit für Schulung und Probebetrieb	Go-live vor Mitte August oder ab November; Kellerbuch ab der nächsten Lese
Benutzerlimit (Basis 1, Standard 5) reicht nicht	Paketwechsel nötig	In Phase 0 Benutzerzahl klären; Upgrade über /abo jederzeit
Zwei Ansprechpartner beim Betrieb widersprechen sich (Rabatte, Kategorien)	Nacharbeit in Phase 5	Ein Betriebs-Manager entscheidet; Entscheidungen im Abnahmeprotokoll

Offene Entscheidungen bei IC&P: Einrichtungspauschale je Paket oder nach Aufwand (Anlage 3 nennt bisher nur 150 €/h für Support); wer beim Betrieb die Schulung für Basis mit nur einem Benutzer bezahlt; ob der Onboarding-Guide in der App um die Aufgabenzuordnung und die Benachrichtigungen ergänzt wird; Registrierkasse (Anlage 4) als eigenes Folgeprojekt nach dem Jour fixe.

Checkliste je Mandant

Zum Kopieren in die Projektakte des Betriebs; Punkte mit (S) gelten ab Standard, (P) nur für Premium.

Phase 0 – Vorbereitung

☐ Erstgespräch geführt, Paket gewählt, Altdaten-Inventur liegt vor

- ☐ Nutzungsvertrag V2 mit Anlagen 1–3 unterschrieben
- ☐ Betriebs-Manager, Vertretung, Entra-Admin, (S) Steuerberater benannt
- ☐ Schulungstermin und Go-live-Tag fixiert (nicht in der Lese)
- ☐ NIS-2-Größe geklärt, ggf. Sicherheitsblatt übergeben; Bedarf an Barrierefreiheit erfragt

Phase 1 – Anlage

- ☐ Mandant mit Slug und Kundennummernkreis angelegt, Abo aktiv, Paketmodule geprüft
- ☐ Betriebs-Manager als tenant_admin, weitere Benutzer mit Rolle und Schreibmodulen
- ☐ Betriebsdaten, Bankverbindung, USt-Satz, Nummernkreise, Branding, Regeln (Mein Betrieb)
- ☐ Rollen nach Mindestrechten, nur persönliche Konten, automatische Abmeldung gesetzt, Branding-Kontrast geprüft
- ☐ Smoke-Test im Systembericht für den Mandanten grün

Phase 2 – Stammdaten

- ☐ Rieden und Flurstücke importiert, Flächen gegen AMA geprüft
- ☐ Behälter mit Volumen und Standort angelegt
- ☐ PSM-/Düngemittel-Stammdaten erfasst
- ☐ Kontakte und Firmen importiert, Dubletten bereinigt, E-Mail-Adressen vollständig
- ☐ Rabattgruppen und Preise angelegt
- ☐ Flaschenlager zum Stichtag importiert, Kellerbestand stimmt

Phase 3 – Module

- ☐ Testverkauf mit Rechnung, Offene Posten und Zahlungseingang
- ☐ Entra: App-Registrierung (mehrinstanzenfähig), Umleitungs-URIs, Geheimnis mit Ablaufdatum notiert, Grundberechtigungen mit Administratorzustimmung
- ☐ optional Entra/Exchange: .Shared-Berechtigungen, Vollzugriff direkt je Person, „Senden als“
- ☐ optional Entra: Calendars.ReadWrite freigegeben, danach Schalter „Termine in Outlook anlegen“, Benutzer neu verbunden
- ☐ E-Mail-Anbindung je Benutzer (M365) oder SMTP, Test-Mail gesendet
- ☐ Aufgabenzuordnung und Benachrichtigungen (Glocke, E-Mail) getestet
- ☐ Fristenkalender, Morgenbericht, Frag dein Weingut geprüft
- ☐ (S) E&A: Buchhaltungsart, Kategorien/Konten, Betriebsbeginn, Eröffnungssalden, UVA-Zeitraum
- ☐ (S) BMD-Export mit Steuerberater getestet
- ☐ (S) Newsletter: Absender authentifiziert, Testaussendung, Abmeldung geprüft
- ☐ (S) Controlling: Kostenstellen und Kostenarten, Zeiterfassung
- ☐ (P) bot:112 aktiviert und eingeführt
- ☐ (P) Exportauftrag mit Transportbescheinigung getestet
- ☐ optional: SumUp gekoppelt, Kellergemeinschaft eingerichtet

Phase 4 – Schulung und Go-live

- ☐ Schulung Kern (2 h) für alle Benutzer
- ☐ (S) Schulung Buchhaltung, Newsletter/Controlling; (P) bot:112 und Export
- ☐ 2 Wochen Probebetrieb mit echten Buchungen
- ☐ Abnahme nach Kriterien aus Phase 4 protokolliert
- ☐ Go-live: Altsystem nur lesend, Stichtag dokumentiert
- ☐ Sicherheits-Kurzschulung gehalten, Offboarding-Verantwortlicher benannt

Phase 5 – Nachbetreuung

- ☐ Call Woche 1, Beobachtung Systembericht bis Tag 30
- ☐ Abschlussgespräch mit Kennzahlen, Übergabe an Support
- ☐ Erste Lese bzw. erster Monatsabschluss begleitet
